

UPS5000-E-(25kVA-75kVA)-SM 快速指南(半柜高)


文档版本：02
部件编码：31500ANJ
发布日期：2019-06-28



版权所有 © 华为技术有限公司2019。保留一切权利。

1 产品简介

UPS型号	重量	尺寸（高×宽×深）
UPS5000-E-75K-SM	<188kg	1020mm×440mm×850mm

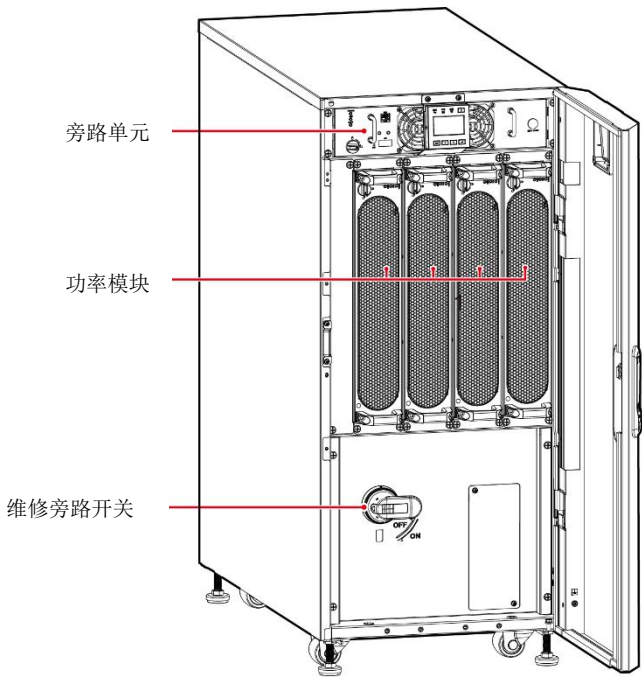

UA05W00006

注意

1. 安装设备前请详细阅读用户手册了解产品信息及安全注意事项。
2. 安装操作设备时，必须使用绝缘工具。
3. UPS必须由华为或其代理商认证的工程师进行安装、调测和维护，否则可能危及人身安全并且导致设备故障，由此引起的UPS损坏不属保修范围。


2 安装UPS

场景1：地面安装

紧固安装

1. 根据划线模板确定安装孔位，打孔并安装膨胀管。

单位：mm

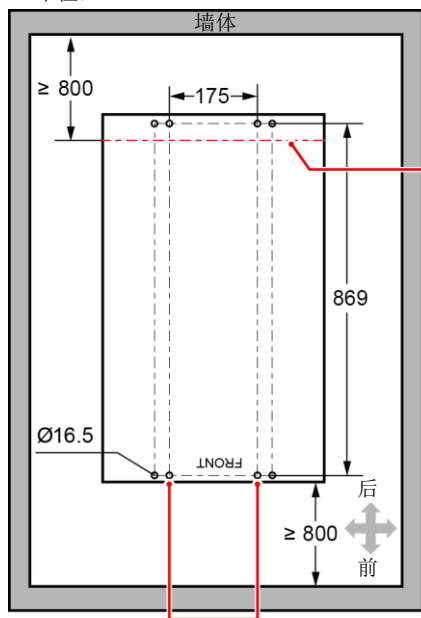


机柜后
方边缘

L型弯角件固定孔位

UA12S00003


2. 调节地脚螺栓，先确保地脚螺栓触地，再调平UPS。
3. 打开UPS的前门，拆除后盖板。
4. 用L型弯角件将机柜固定在地面。

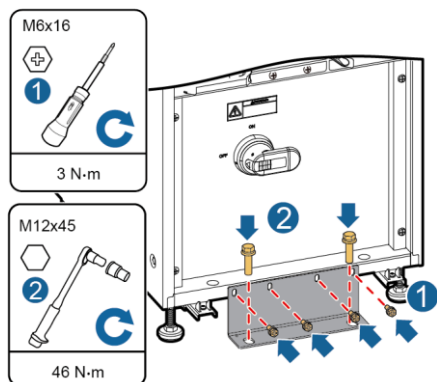

UA12H00022

无紧固安装

1. 用扳手下调UPS机柜底部的四个支撑地脚，直至UPS机柜底部四个滚轮均悬空，支撑地脚完全支撑机柜。
2. 用水平尺检查机柜是否水平，如果不水平，则继续调整支撑地脚直到UPS达到水平状态。

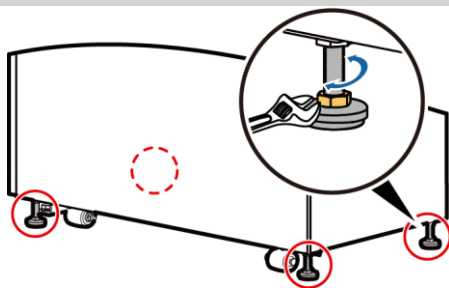


UA12000010

场景2：机架式安装

注意

1. 机架式安装要求对应机架必须符合IEC297标准，机架深度不小于1100mm，同时机架中导轨安装深度应大于820mm。
2. UPS较重且需要下走线，建议将UPS安装在机架的最下方。


1. 先在机柜两侧安装导轨，然后在机架前后各安装一个加强梁。

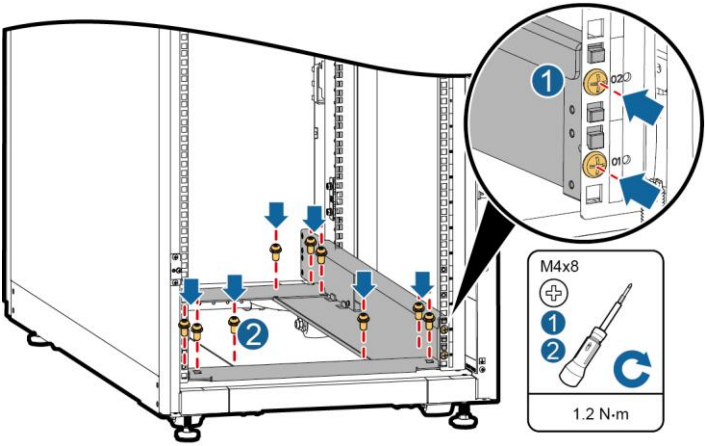



2. 在机架前端左右两侧安装浮动螺母。

3. 拆除UPS的前门和功率模块。
4. 安装挂耳，将机箱装入机架。

UA12H00023

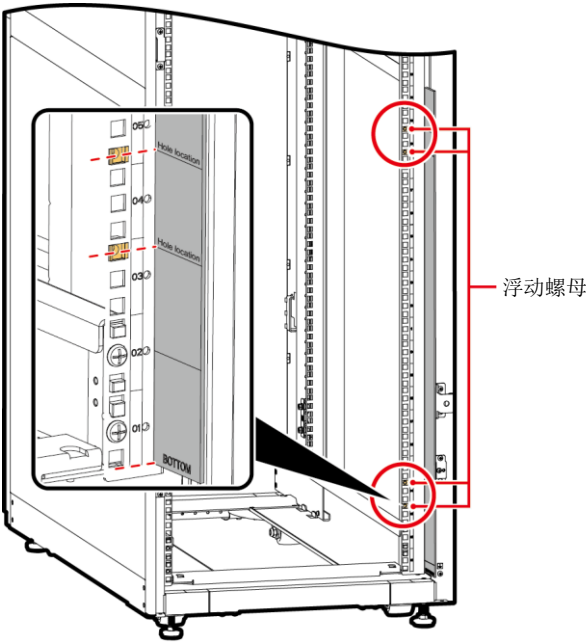


UA12W00016

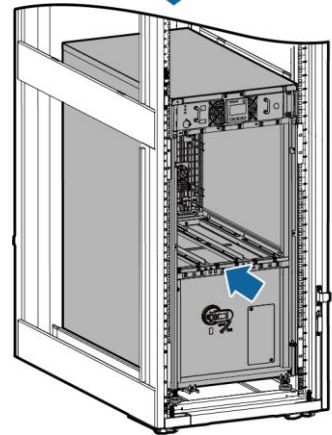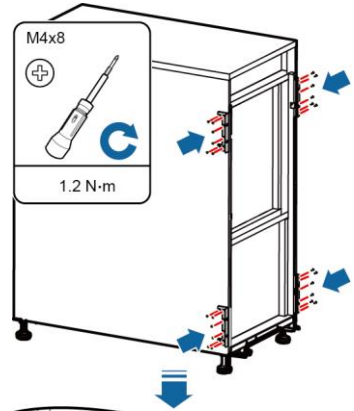


UA21H00107

5. 调节地脚螺栓，使机箱底端与刻度板上刻度线平齐，并调整UPS水平。

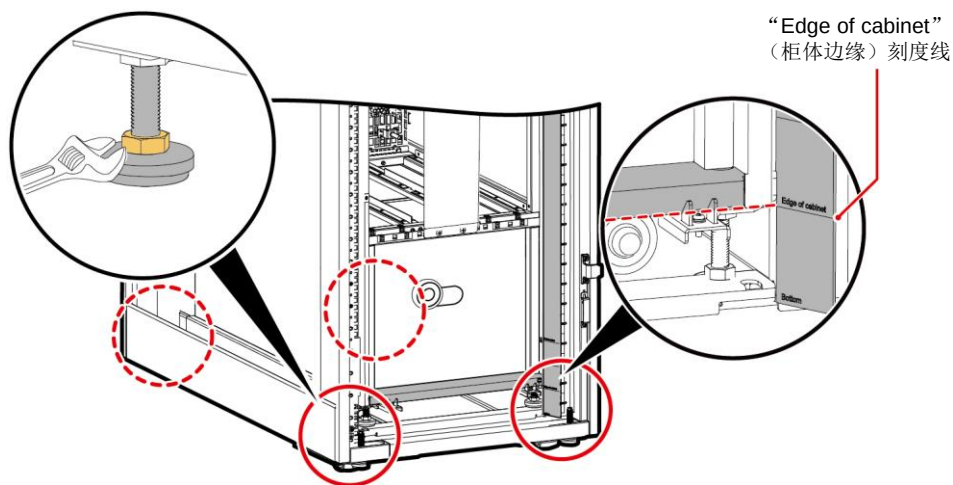

UA12H00019

6. 固定UPS挂耳与机架。

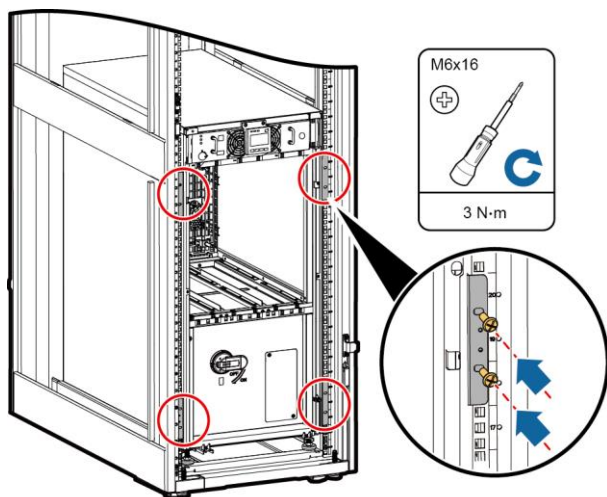

UA21H00109


7. 将功率模块装回UPS机箱，并将功率模块就绪开关全部置于就绪“**B**”状态

3 安装线缆

3.1 UPS接线方法参考

警告

- 制作线缆时，务必远离机柜，避免线缆碎屑不小心进入机柜，引起上电打火造成人身伤害及设备损害。
- 安装线缆完毕后，请及时清理机柜。务必保障机柜内和四周无异物。
- 用户现场制作端子，剥线时铜线的长度应与端子紧固导体部分等长。

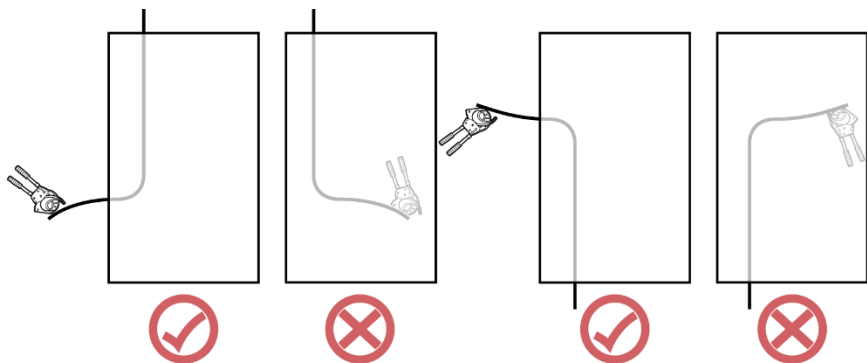


UA21110068

说明


走线路径仅供参考，请根据实际情况连接。

3.2 安装线缆

1. 拆除机箱背面的配电单元盖板。
2. 根据线缆数量和位置，拆除机柜底部的小盖板。
3. （主旁同源无需进行此步骤）拆除主路和旁路输入之间的连接铜排。

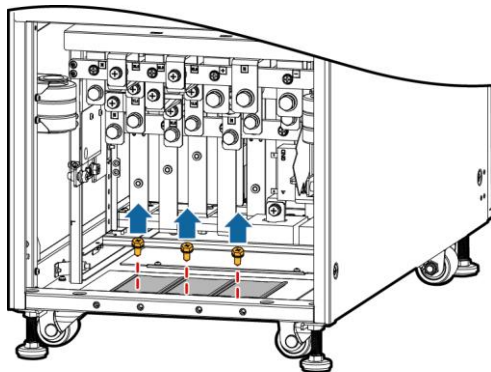


UA12H00020

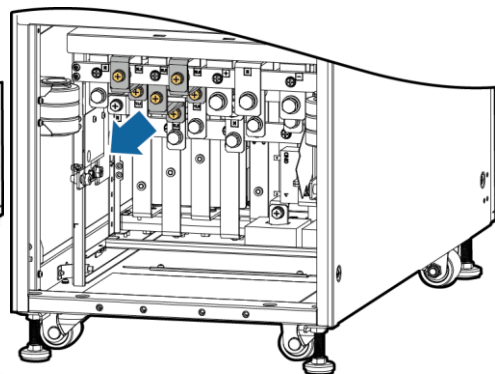

UA12H00017

4. 连接地线、功率线和信号线。

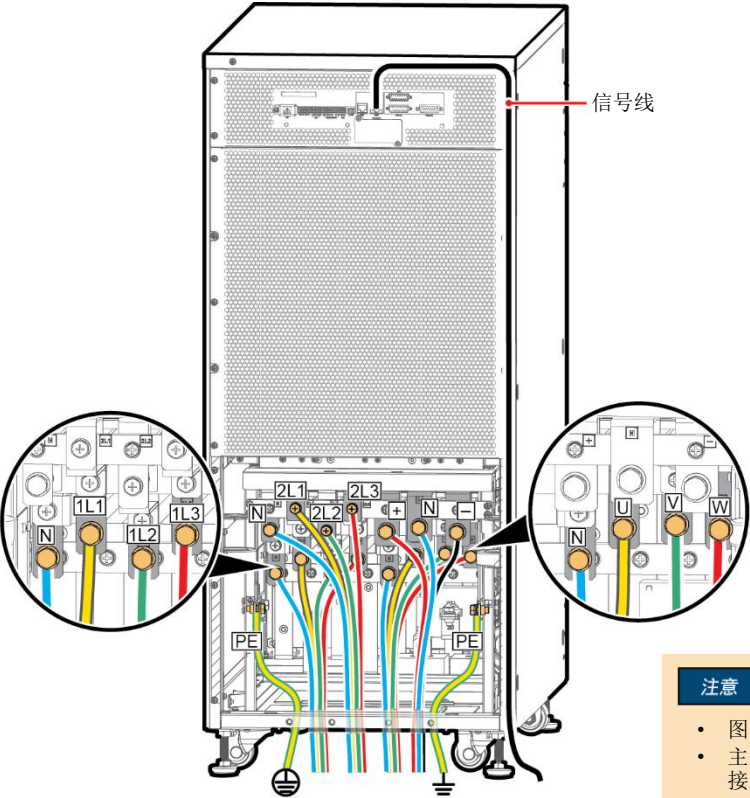


注意

- 图中线缆数量仅供参考。
- 主旁同源时，不需要连接旁路输入线缆。

UA12i00005

接口说明	丝印	螺栓规格	扭力力矩
主路输入	1L1、1L2、1L3、N	M8×30	20N•m
旁路输入	2L1、2L2、2L3、N	M8×30	20N•m
电池输入	+、N、-	M10×30	35N•m
输出	U、V、W、N	M8×30	20N•m
保护地	PE	M8×20	13N•m

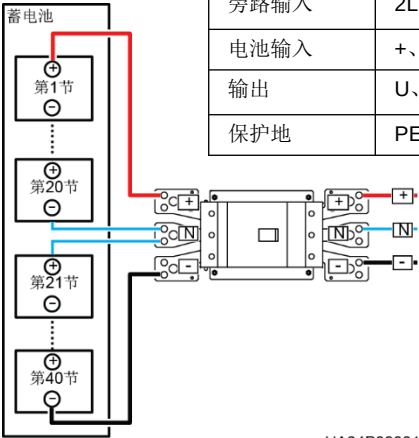


UA24P00001

说明

从正负电池组中间连接点引出的线即为电池N线。以40节电池的电池组为例，正、负电池组平均分配，各20节电池，从正、负电池中间连接点引出的线即为电池N线。

4 安装后检查

1. 检查机柜顶部、底部、接线铜排、开关和单元后方无异物。




UA12W00015

2. 检查完成后，装回所有盖板。
3. （撕去密封泥的纸质保护膜）敷设线缆完成并确认无误后，用密封泥封堵线缆与机柜间的缝隙。

注意

密封泥必须整片使用，并且只能从上面密封。

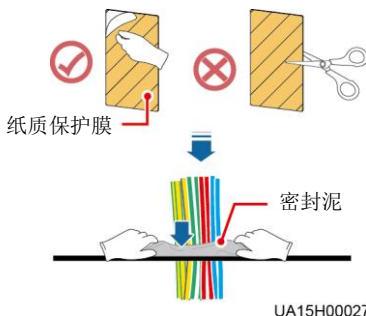

4. 上电前请勿拆除密封机柜的防尘罩，防止内部积灰。

5 上电开机

注意

1. 上电前，请确认《UPS5000开机服务报告》和第4章安装后检查中的检查项均已检查完毕。
2. 测量UPS的前级输入开关的电压及频率，电压范围：138V AC~485V AC（线电压），频率范围：40Hz~70Hz。

5.1 上电


闭合前级旁路、主路输入开关。



系统上电后，系统开始初始化，同时监控显示单元中显示华为logo和初始化进度条。

5.2 UPS关键参数设置

1. 进行“快速设置”，设置过程中，如果出现“旁路供电”和“电池未接”告警，无需处理。

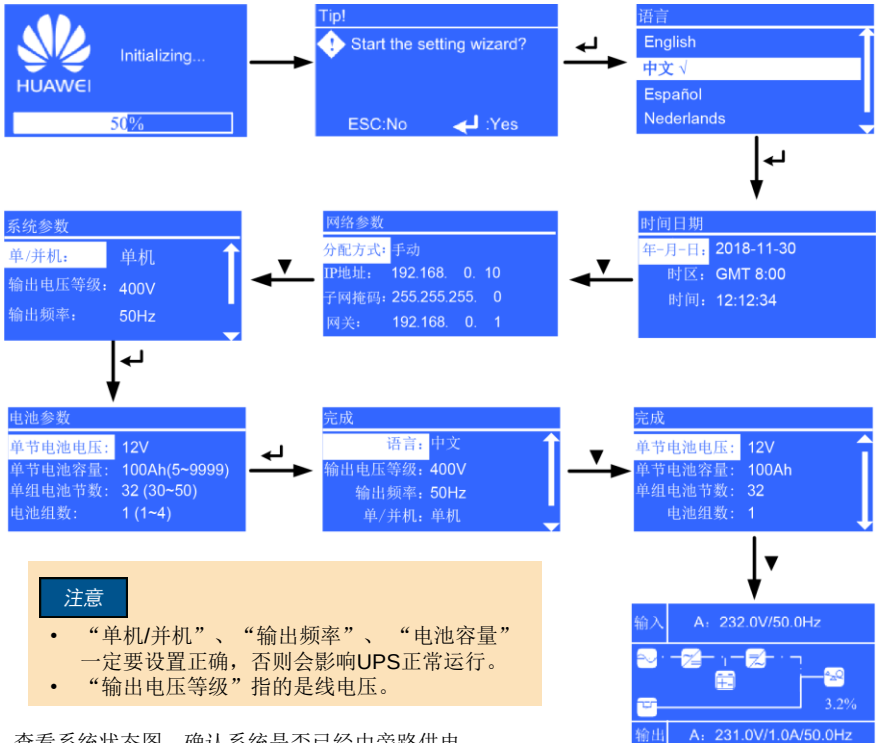


2. 查看系统状态图，确认系统是否已经由旁路供电。

3. 开启逆变器。

- 在监控显示单元主菜单上选择“控制”，系统弹出登录窗口，输入密码。
- 在“控制”菜单上选择“单机逆变开机”，在弹出的提示对话框中选择“开机”，按 ，完成逆变开机操作。

系统用户	LCD预设密码	Web预设密码
admin	000001	Changeme
operator	000001	Changeme

4. 检查系统是否由主路逆变供电，“旁路供电”告警是否消失，同时使用万用表检查三相输出电压有效值（应为220V AC/230V AC/240V AC）和频率（应为50Hz/60Hz）是否正常。
5. 闭合电池组空开（如有多组电池，需要先闭合每个电池组的空开，然后再闭合电池组和UPS之间的总空开），“电池未接”告警消失。
6. （可选）如选配BCB-BOX电池开关盒，请参考图形设置干接点相关参数。



7. 闭合UPS后级输出开关给负载供电。

6 关机


注意

如果系统旁路正常，UPS逆变关机后，系统进入旁路供电模式；如果系统旁路异常，逆变关机后系统进入无输出模式，系统输出断电。关机操作前，请确认负载已经关闭，可以承受随时断电的工况。

6.1 UPS单机关闭逆变器输出进入旁路工作模式

1. 在监控显示单元主菜单上选择“控制”，单击“单机逆变关机”。
2. 在系统弹出的提示对话框中单击“关机”，按 ，完成逆变关机操作。

6.2 UPS单机下电操作



企业技术支持请扫描二维码

华为应用市场



运营商技术支持请扫描二维码

华为应用市场



更多资料请扫描二维码

Support-E



Support



微信



或登录华为技术支持网站: <http://support.huawei.com/enterprise>
<http://support.huawei.com>

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编: 518129

www.huawei.com
